MELDING - Buiten gebruik stellen gasverbrandingstoestel

Voor opdrachtgever/eindgebruiker

Geachte eigenaar* en/of bewoner,

Tijdens het onderhoud van uw verwarmingstoestel hebben wij een situatie aangetroffen die de veiligheid van u, uw medebewoners en mogelijk uw omgeving ernstig in gevaar brengt. Om deze reden hebben wij uw gastoestel buiten gebruik gesteld. Wij willen u erop wijzen dat, als u deze zelf weer in gebruik stelt of deze in gebruik laat stellen door een derde partij, wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen nemen voor uw veiligheid.

Omschrijving van de aangetroffen situatie

De verbrandingsgasafvoerleiding is lek en er kunnen gevaarlijke gassen de woning instromen

Omschrijving van de aard van onveiligheid

- [ ] Te hoge koolmonoxide-waarde gemeten aan de ketel
- [x] Ondeugdelijk gemonteerde rookgasafvoer
- [ ] Onveilige aansluiting gastoevoer
- [ ] Overig

Marineblauw 1CO, Zoetermeer

Dr Watson

Handtekening Technicus

Handtekening Klant: P. Pietersen

PP

Uw Logo hier

Onderhoud kenmerk	Onderhoud_AFKEUR_N
Installatie geplaatst bij	Test locatie CO
Adres	Marineblauw 1CO
Postcode	2718 KE
Plaats	Zoetermeer
Datum van onderhoud	26 oktober 2022
Exemplaar voor	Opstellingsruimte Opstelruimte
Toestel	**1**

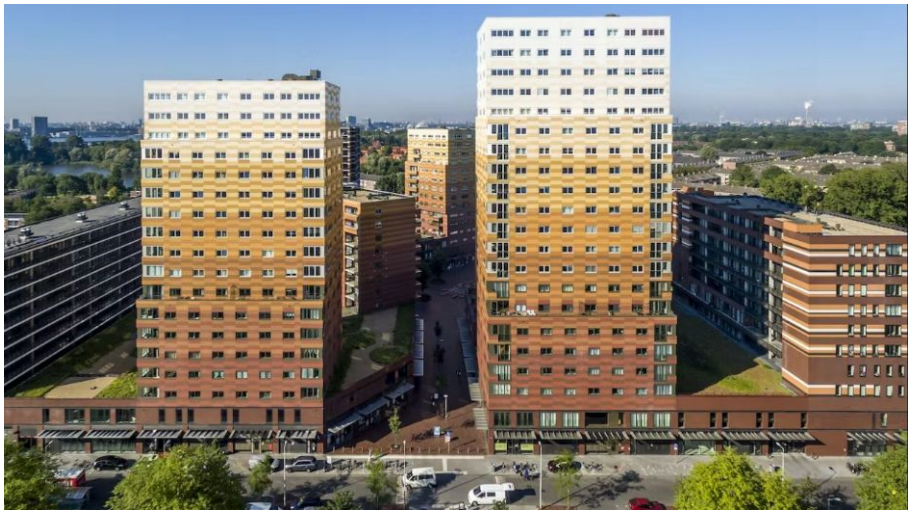

KOOLMONOXIDE VRIJ
VEILIGE INSTALLATIE

Fabricaatgebonden onderhoud en in bedrijf stellen gasverbrandingstoestellen
Niet akkoord

INHOUDSOPGAVE

Gegevens Algemeen / Onderhoud / Uitvoerende / Opdrachtgever 3
Eindconclusie 4
Niet akkoord 5
Toestel Remeha Avanta 28C CW4 - 015-240-AA / 1
Gegevens 6
Checklist ruimte 7

Gegevens van het onderhoud

Onderhoud referentie	Onderhoud_AFKEUR_N versie:11
Naam	Test locatie CO
Adres	Marineblauw 1CO
Postcode / Plaats	2718 KE / Zoetermeer
Datum van onderhoud	26 oktober 2022

Gegevens van het bedrijf dat het onderhoud heeft uitgevoerd

Bedrijfsnaam	Rapport Online
Adres	Marineblauw 149
Postcode / Plaats	2718 KE / Zoetermeer
Mobiel	06-12345678
Contactpersoon	Afdeling service
E-mail	info@rapport-online.nl
Certificaat nummer	nog in te vullen
Geldig tot	31-12-2022

Gegevens van de drijver/opdrachtgever

In opdracht van	Demo installatietechniek
Contact persoon	Dhr. Contactme
Adres	Spui 1
Postcode / Plaats	2500CM / Den-Haag
Telefoon	070-12345678

Meetapparatuur

Meter	Merk / Type	Identificatienummer
Rookgasanalysemeter	Euro Index Eurolyzer STx OCd	034602787

De gasverbrandingsinstallatie is buiten werking gesteld omdat is vastgesteld dat de installatie niet veilig functioneert.
De reden van buiten werking stellen staat beschreven op de pagina afkeur punten.
De gebruiker van de installatie is op de hoogte gesteld van het niet veilig functioneren van verbrandingstoestel.

Onderhoud Interval

De fabrikant van het toestel schrijft voor dat het toestel jaarlijks gecontroleerd en zonodig gereinigd dient te worden.

De monteur, bevoegd tot het uitvoeren van onderhoud.

Dr Watson

d.d. 27 oktober 2022

Hier zijn de tekortkomingen vermeld die zo spoedig mogelijk moeten worden hersteld.

Ruimte; Opstelruimte

Rookgas afvoerkanaal/leiding: dichtheid

Het verbrandingsgasafvoerleiding systeem is lek

Toestel volgnummer	015-240-AA / 1
Fabrikant en type	Remeha Avanta 28C CW4
Serienummer	dummyco001
Bouwjaar	2012
Soort toestel	Atmosferisch Low-Nox HR
Uitvoering	Gesloten
Regeling belasting	Modulerend
Nominale Belasting (Hs) - hoog	27.6 kW
Nominale Belasting (Hi) - hoog	24.8 kW
Nominaal vermogen (80/60) °C - hoog	24 kW
Toepassing installatie	Centrale verwarming en warmwater
Soort medium	Water
CE markering aanwezig	Ja
Indelings code	C53

Opstelling checklist - Verbrandingsgasafvoerleiding (systeem)

Rookgas afvoerkanaal/leiding: **dichtheid**	**Zie Niet akkoord**

Uw Logo hier

RAPPORT - Buiten gebruik stellen gasverbrandingstoestel

Intern rapport t.b.v. klantdossier

Naam eigenaar/gebruiker	Test locatie CO
Adres	Marineblauw 1CO
Postcode	2718KE
Plaats	Zoetermeer

Op bovengenoemd adres hebben wij een verwarmingstoestel buiten bedrijf gesteld. De reden is een ernstig veiligheidsrisico voor de bewoner en zijn/haar directe omgeving. Wij hebben dit aangegeven bij de bewoner en wij hebben een voorstel gedaan om aanpassingen aan de installatie te doen die het veiligheidsrisico wegnemen. De bewoner is niet ingegaan op ons voorstel. Omdat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het wederom in gebruik stellen van het toestel door de bewoner of derde partijen, is het toestel buiten werking gesteld, dan wel geblokkeerd.

Aard van het veiligheidsrisico

De verbrandingsgasafvoerleiding is lek en er kunnen gevaarlijke gassen de woning instromen

Toestel

Fabrikant en type gastoestel	Remeha Avanta - 28C CW4
Bouwjaar	2012

Ondernomen acties

- [ ] Oorzaak/probleem getracht te verhelpen
- [x] Bewoner geinformeerd over veiligheidsrisico
- [ ] Bewoner geinformeerd over te nemen maatregelen voor herstel en buiten bedrijfstelling
- [ ] Opdracht voor herstel niet aanwezig of ontvangen
- [ ] Verbrandingstoestel uit bedrijf genomen (gastoestelkraan gesloten, stekker los
- [x] Verbrandingstoestel geblokkeerd voor werking, door (omschrijf maatregelen)

Gaskraan dicht gedraaid en label aangebracht

- [x] Sticker 'Buiten werking' aangebracht
- [x] Foto gemaakt van situatie/toestel met waarschuwingssticker/label

Contact gegevens

Installatiebedrijf	Rapport Online
Adres	Marineblauw 149
Postcode	2718KE
Plaats	Zoetermeer
Datum	27-10-2022
Tijdstip	12:42

Foto van toestel met 'buiten gebruik' sticker/label

Handtekening Technicus:

Handtekening Klant: P. Pietersen

PP
